


项目落地实施计划

编制日期：2026年5月26日 | 项目：南宁家政智能动态定价系统 | 版本：V1.0

总体时间线

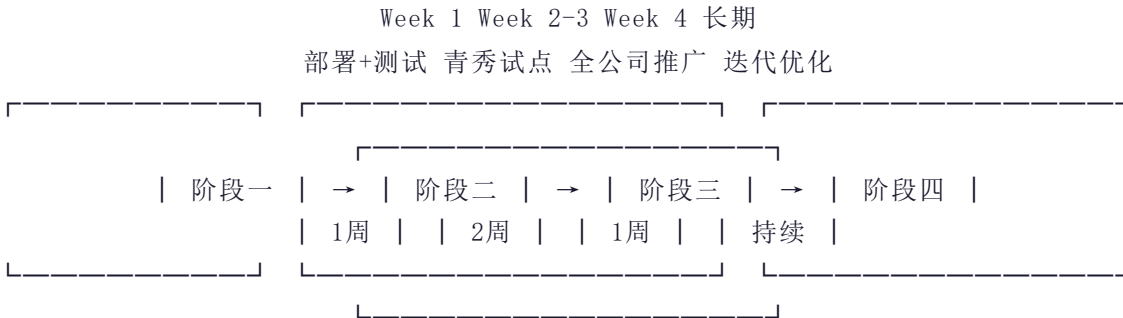

阶段一：系统部署与内部测试（第1周）

目标

- 系统在服务器上正常运行
- 核心团队成员完成培训，能独立操作系统
- 用历史数据验证系统准确性

任务清单

序号	任务	负责人	验收标准	预计耗时
1.1	服务器环境部署（Python 3.10+, 依赖安装）	IT	uvicorn 正常启动, /healthz 返回 OK	0.5 天
1.2	导入历史订单数据（如有）	运营	数据成功导入 data/nanning/, 可在复盘页面查看	1 天
1.3	运行数据生成脚本	IT	7 个 CSV 文件生成成功	0.5 天

序号	任务	负责人	验收标准	预计耗时
1.4	训练 AI 定价模型	IT	pricing_model.json 生成，模型信息 API 返回正常	0.5 天
1.5	核心团队培训（销售主管+运营经理+总经理）	项目组	每人独立完成一次完整报价流程	1 天
1.6	用历史订单验证系统准确性	运营	回测显示 AI 定价亏损率 ≤ 旧定价	0.5 天
1.7	配置初始成本参数（对齐实际成本）	运营+财务	参数经财务确认无误	0.5 天
1.8	准备销售培训材料和 FAQ	运营	培训材料打印/发送完毕	0.5 天

里程碑验收

- [] 系统在生产服务器正常启动，API 和前端均可正常访问
- [] 导入历史数据，回测结果显示 AI 定价不差于人工定价
- [] 核心团队（≥3人）完成操作培训，可独立使用
- [] 销售培训材料和 FAQ 准备就绪

阶段二：青秀区试点运行（第2-3周）

目标

- 在青秀区真实业务中验证系统效果
- 收集一线销售反馈，调整规则参数
- 确保销售团队适应新定价模式

试点范围

维度	范围
区域	仅青秀区（业务量最大、价格敏感度最低）
服务	全部 4 种服务类型
人员	青秀区销售团队（约 3-5 人）
模式	AI 定价为主，可手动申请优惠

任务清单

序号	任务	负责人	验收标准	预计耗时
2.1	青秀区销售团队培训（小程序使用+议价规范）	销售主管	每人完成 3 次模拟报价，正确率 100%	第1天
2.2	正式切换青秀区报价为系统报价	销售主管	青秀区所有新单使用系统报价	第2天
2.3	每日跟踪：记录系统报价 vs 实际成交价偏差	运营	每日记录偏差原因（议价/加项/工时偏差等）	每天
2.4	第一周回顾：分析报价准确性和亏损率	运营+项目组	出具第1周试点报告	第7天
2.5	根据反馈调整成本参数或规则	运营+项目组	调整后的参数经验证无误	第7-8天
2.6	第二周继续试点，验证调整效果	销售主管	第二周亏损率 ≤ 第一周	第8-14天
2.7	试点总结报告	运营+项目组	报告包含：关键指标、问题清单、改进措施	第14天

试点期重点观察指标

指标	目标值	警戒线
系统报价采纳率	≥ 80%	< 60%
报价后成交率	≥ 60%	< 40%
订单亏损率	≤ 5%	> 10%
平均毛利率	≥ 20%	< 15%
销售满意度（问卷）	≥ 4/5 分	< 3/5 分

试点退出条件

- ☐ 系统报价采纳率 ≥ 80%
- ☐ 订单亏损率 ≤ 5%
- ☐ 核心参数已根据试点反馈调整到位

- [] 销售团队反馈积极，无重大操作障碍
- [] 试点报告通过管理层审核

阶段三：全公司推广上线（第4周）

目标

- 7 城区全部切换到系统定价
- 全量订单使用 AI 定价
- 完成全员培训

任务清单

序号	任务	负责人	验收标准	预计耗时
3.1	全员培训（分 2 批次：销售+运营）	项目组	全员考核通过（正确完成报价+议价流程）	1 天
3.2	按城区分批次切换（先中端城区，后远郊）	运营	每天切换 2-3 个城区	3 天
3.3	上线首周每日监控数据	运营	每日出具 KPI 快报	每天
3.4	上线周报	运营	包含全量 KPI、问题汇总、改进建议	第7天
3.5	管理层汇报	项目组	演示系统运行效果，汇报关键指标	第7天

切换顺序

- 第1天：江南、西乡塘（订单量中等，风险可控）
- 第2天：兴宁、良庆（五象）
- 第3天：邕宁、武鸣（远郊，需确认交通加价是否足够）
(青秀已在阶段二完成切换)

推广验收标准

- [] 7 城区全部使用系统报价
- [] 全公司销售/运营人员完成培训并通过考核

- [] 上线首周亏损率 $\leq$ 5%
- [] 无因系统定价导致的重大客户投诉
- [] 管理层确认项目达到预期效果

阶段四：系统迭代优化（长期）

月度运维

项目	频率	负责人
成本参数复核（师傅薪资、交通费变动等）	每月	运营+财务
订单复盘 + 亏损分析	每月	运营
模型效果评估（AI vs 规则）	每月	IT
竞品价格监测更新	每月	运营

季度优化

- **模型重训练**：用最新订单数据重新训练 XGBoost 模型
- **规则优化**：根据季度数据调整季节系数、区域加价
- **功能迭代**：根据用户反馈增加新功能
- **竞品分析报告**：深度分析南宁市场格局变化

年度规划

- **Q1-Q2（当前）**：系统稳定运行，AI 定价全面覆盖
- **Q3**：接入实时竞品价格监控，增强市场锚定层
- **Q4**：探索强化学习模型，实现更智能的动态调价
- **次年**：扩展至南宁周边城市（柳州、桂林），验证模型可迁移性

风险与预案

风险	概率	影响	预案
销售不使用系统报价	中	高	强制要求所有报价通过系统生成，纳入绩效考核
AI 定价偏高导致丢单	中	中	随时可切换为纯规则模式（更保守的定价）

风险	概率	影响	预案
成本参数不准确	低	高	阶段一由财务逐项确认，试点期修正
旺季系统压力大	低	低	FastAPI 异步架构可承受，必要时增加 worker
小程序体验差	中	中	同时提供 Web SPA 作为备选

责任人矩阵

角色	姓名（待填）	阶段一	阶段二	阶段三	阶段四
项目负责人	_____	统筹	统筹	统筹	统筹
IT 运维	_____	部署	支持	支持	运维
运营经理	_____	参数确认	数据监控	推广执行	日常运营
销售主管	_____	参与培训	带队试点	全员培训	日常监督
财务	_____	成本审核	—	—	月度复核
总经理	_____	审批	阶段性审核	验收	战略决策

执行原则：小步快跑、先试点再推广、数据驱动决策、问题不过夜。
